


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان (نمایندگی دزفول)

احداث ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان (نمایندگی دزفول)

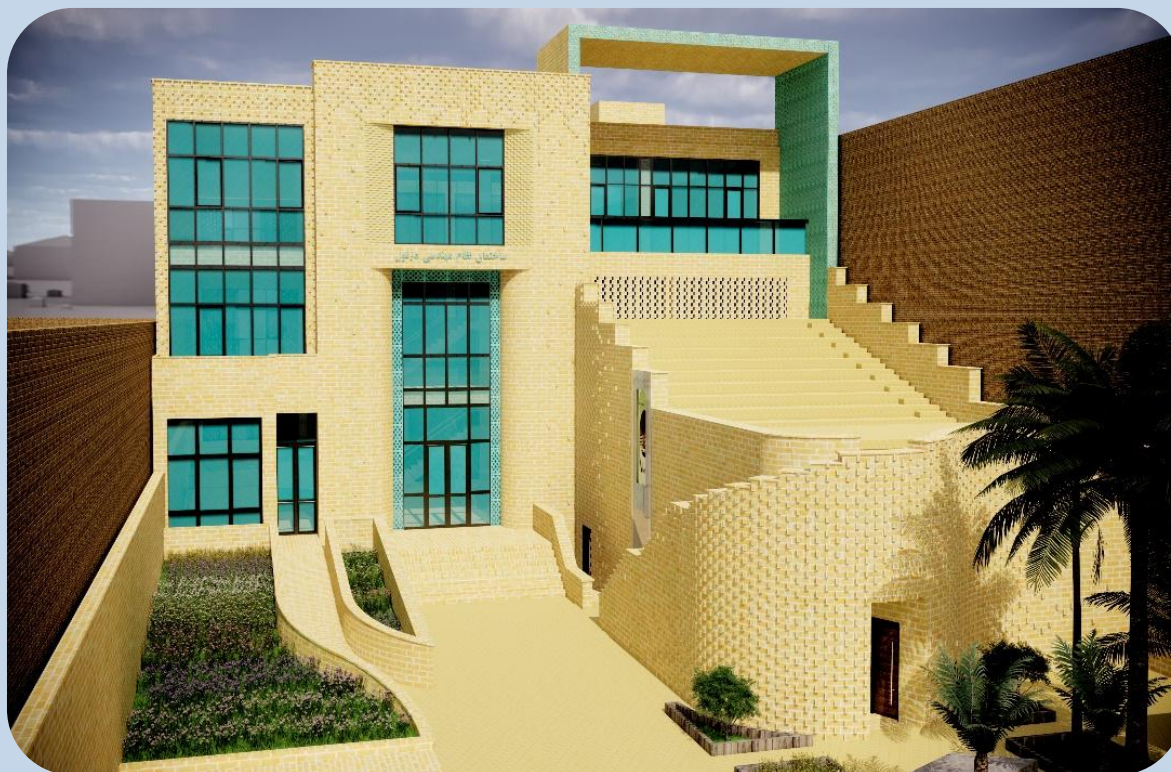


تاریخ گزارش
۱۴۰۴/۰۷/۰۷

مهندسین مشاور
فرداد طرح آرون



احداث ساختمان نظام مهندسی استان خوزستان (نمایندگی دزفول)

- مساحت کل زمین ۲۱۰۰ متر مربع واقع در دزفول، کوی آزادگان، بلوار دانشگاه، جنب پزشکی قانونی می باشد.
- لازم به توضیح است که طرح معماری این پروژه در سال ۱۳۸۸ توسط مهندسان و معماران شهرستان دزفول طراحی و در فروردین ۱۴۰۰ با مساحتی بالغ بر دوهزار و هفتصد مترمربع در چهار سقف (زیرزمین، همکف و دو طبقه بالای همکف)، جهت کاربری اداری و سالن همایش و آمفی تئاتر بازطراحی گردیده است.

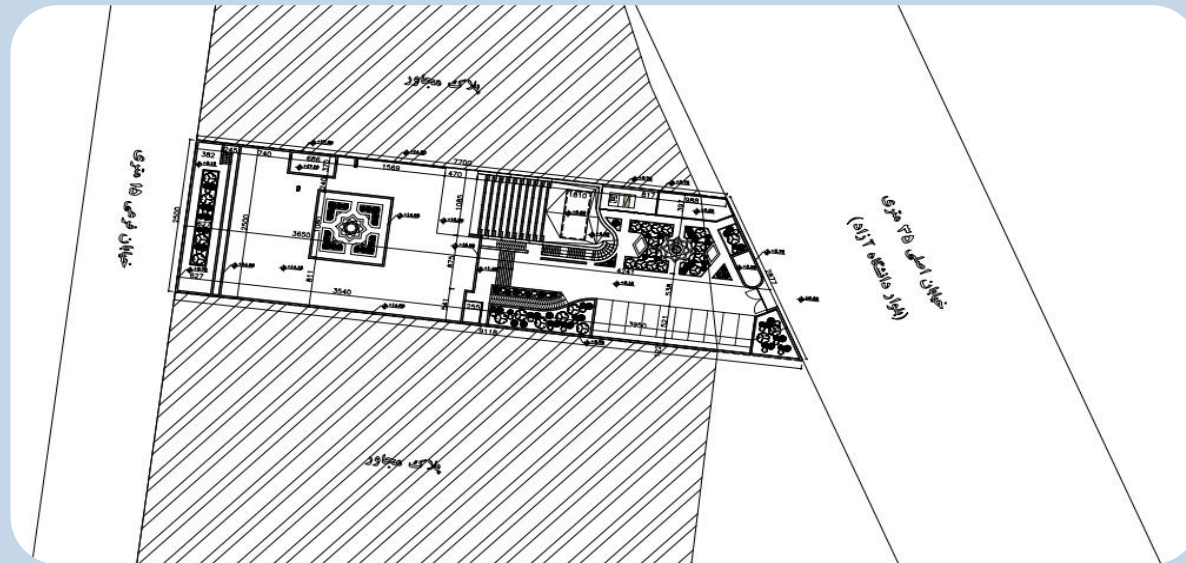



احداث ساختمان
نظام مهندسی استان خوزستان
(نمایندگی دزفول)

عنوان پروژه:

تکمیل احداث ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

شماره و تاریخ قرارداد مدیر پیمان:

۴۵۶۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

شماره و تاریخ قرارداد مشاور:

۴۲۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰

کارفرما:

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

مدیر پیمان:


سید داود آقا محمدی

دستگاه نظارت و مشاور پروژه:

شرکت مهندسیین مشاور فرداد طرح آرون

تاریخ شروع پروژه:

مهر ۱۴۰۴





تصویر هوایی (بزرگنمایی)
از ساختمان نظام مهندسی
دفتر نمایندگی دزفول





تاریخ های کلیدی

شرح عملیات ساختمانی	تاریخ آغاز	تاریخ خاتمه
کلنگ زنی پروژه	آذر ۱۴۰۰	-
پی سازی پروژه	تیر ۱۴۰۱	مرداد ۱۴۰۱
اسکلت پروژه	بهمن ۱۴۰۱	مرداد ۱۴۰۲
سقف پروژه	اسفند ۱۴۰۱	مرداد ۱۴۰۲
فریم در و پنجره های پروژه	مرداد ۱۴۰۳	مرداد ۱۴۰۳
نهای اجرای پروژه	خرداد ۱۴۰۴	-
تاسیسات پروژه	-	-
آسانسور های پروژه	مرداد ۱۴۰۴	-
نازک کاری پروژه	-	-




درصد پیشرفت بخش های مختلف پروژه

بخش	درصد پیشرفت
سازه	۱۰۰٪
معماری	۲۵٪
تاسیسات برقی	۰٪
تاسیسات مکانیکی	۰٪
تاسیسات تهویه	۰٪
آسانسور	۲۰٪
درصد پیشرفت کل	۴۹٪



نمودار پیشرفت ریالی پروژه

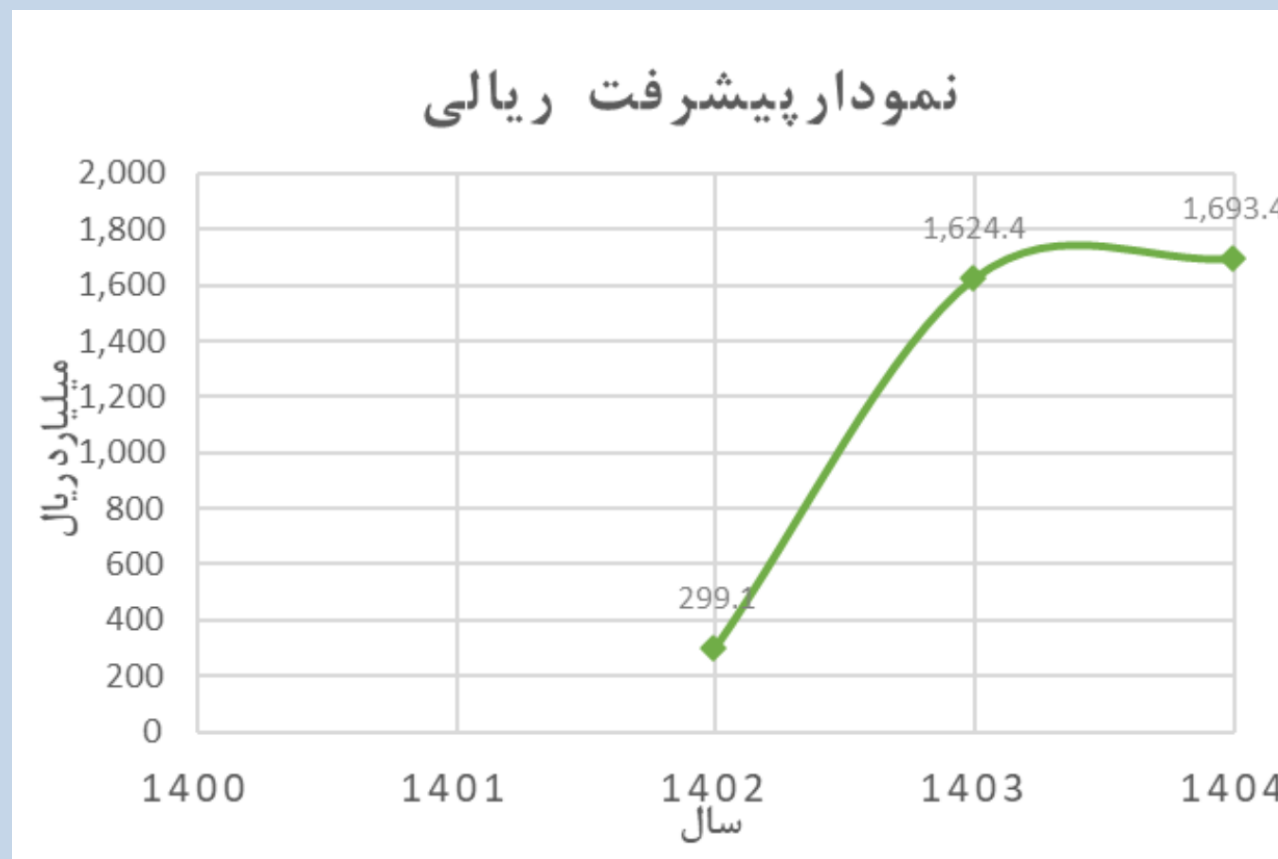



نقشه برداری

مهر ۱۴۰۰





اجرای بتن مگر


تیر ۱۴۰۱





اجرای فونداسیون

مرداد ۱۴۰۵

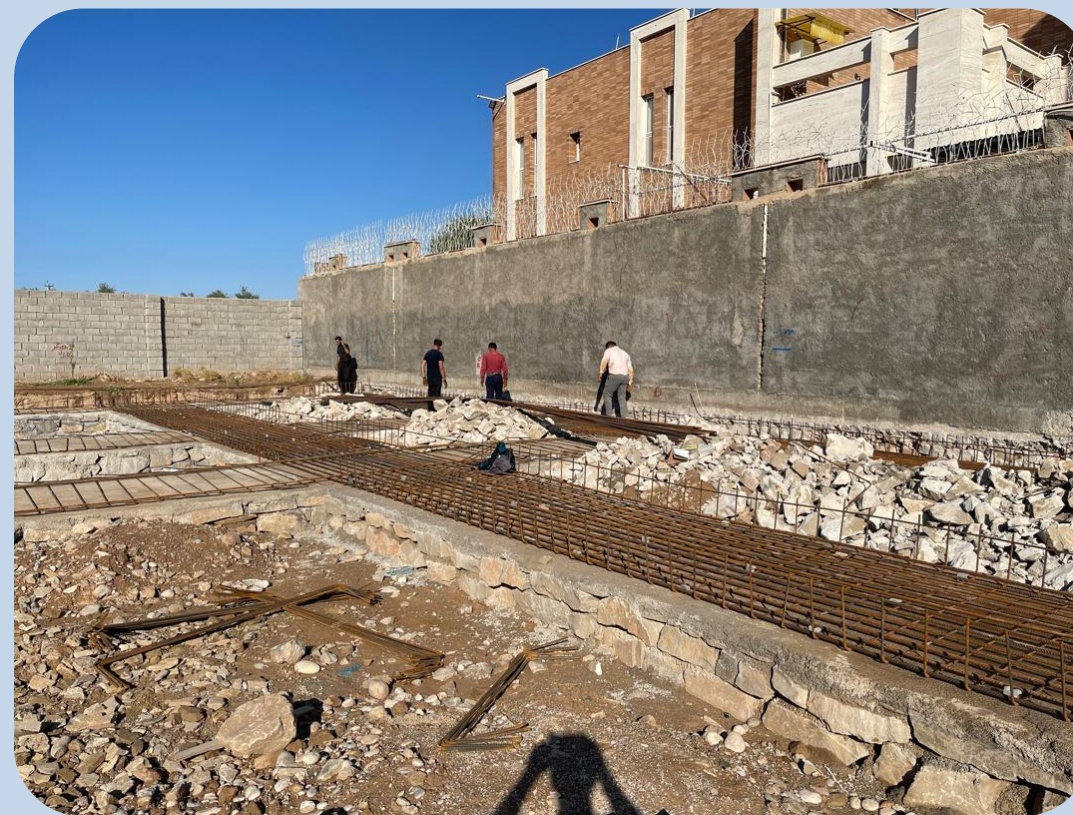



اجرای قالب بندی ستون ها

بهمن ۱۴۰۱





اجرای ستون ها


اردیبهشت ۱۴۰۲





دیوار چینی وال اسپید طبقات

فروردین ۱۴۰۳

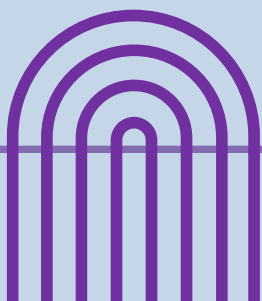



مصلح ورودی به کارگاه

شهریور ۱۴۰۳





برگزاری جلسه وبازدید از پروژه

بهمن ۱۴۰۳





بندکشی نما (ضلع شرقی) پزشکی قانونی

تیر ۱۴۰۴





اجرای شاسی کشی آسانسور

مرداد ۱۴۰۴





اجرای نمای ضلع شرقی

شهریور ۱۴۰۴

